



2010 ÖREBRO



-
-
- ERBJUDANDE FRÅN SOFT
 - DET UNDERSÖKANDE ARBETET PÅBÖRJADES I NOVEMBER 2006
 - SAMVERKAN HAR SKETT MED ORIENTERINGSKLUBBARNNA OCH VIKTIGA SAMARBETSPARTNERS
 - VI SVARAR "JA" ELLER "NEJ" I MAJ 2007

O-RINGEN 2010
PLANERINGSINRIKTNING






***"ÖREBRO KOMMUN UTLOVAR ETT BRA STÖD FÖR UPPBYGGNAD AV
CENTRALORTEN SAMT FÖR ATT SAMORDNA PROGRAM/
UNDERHÅLLNING MM UNDER JUBILEUMS-PERIODEN 2010***

("Vid riksmötet i Örebro sommaren 1810 valdes Jean-Baptiste Bernadotte till tronföljare i Sverige. ")

Centralort

-
-
- CENTRALORT ÖREBRO - GUSTAVSVIK
 - TVÅ ETAPPER I ÖSTANSJÖ
 - TVÅ ETAPPER I BERGSLAGEN - FELLINGSBRO
 - AVLUTANDE ETAPP I ÖREBRO - MARKASKOGEN?, SÖRBYSKOGEN?
 - Ytterligare några etappalternativ studeras.


CENTRALORT och ETAPPER

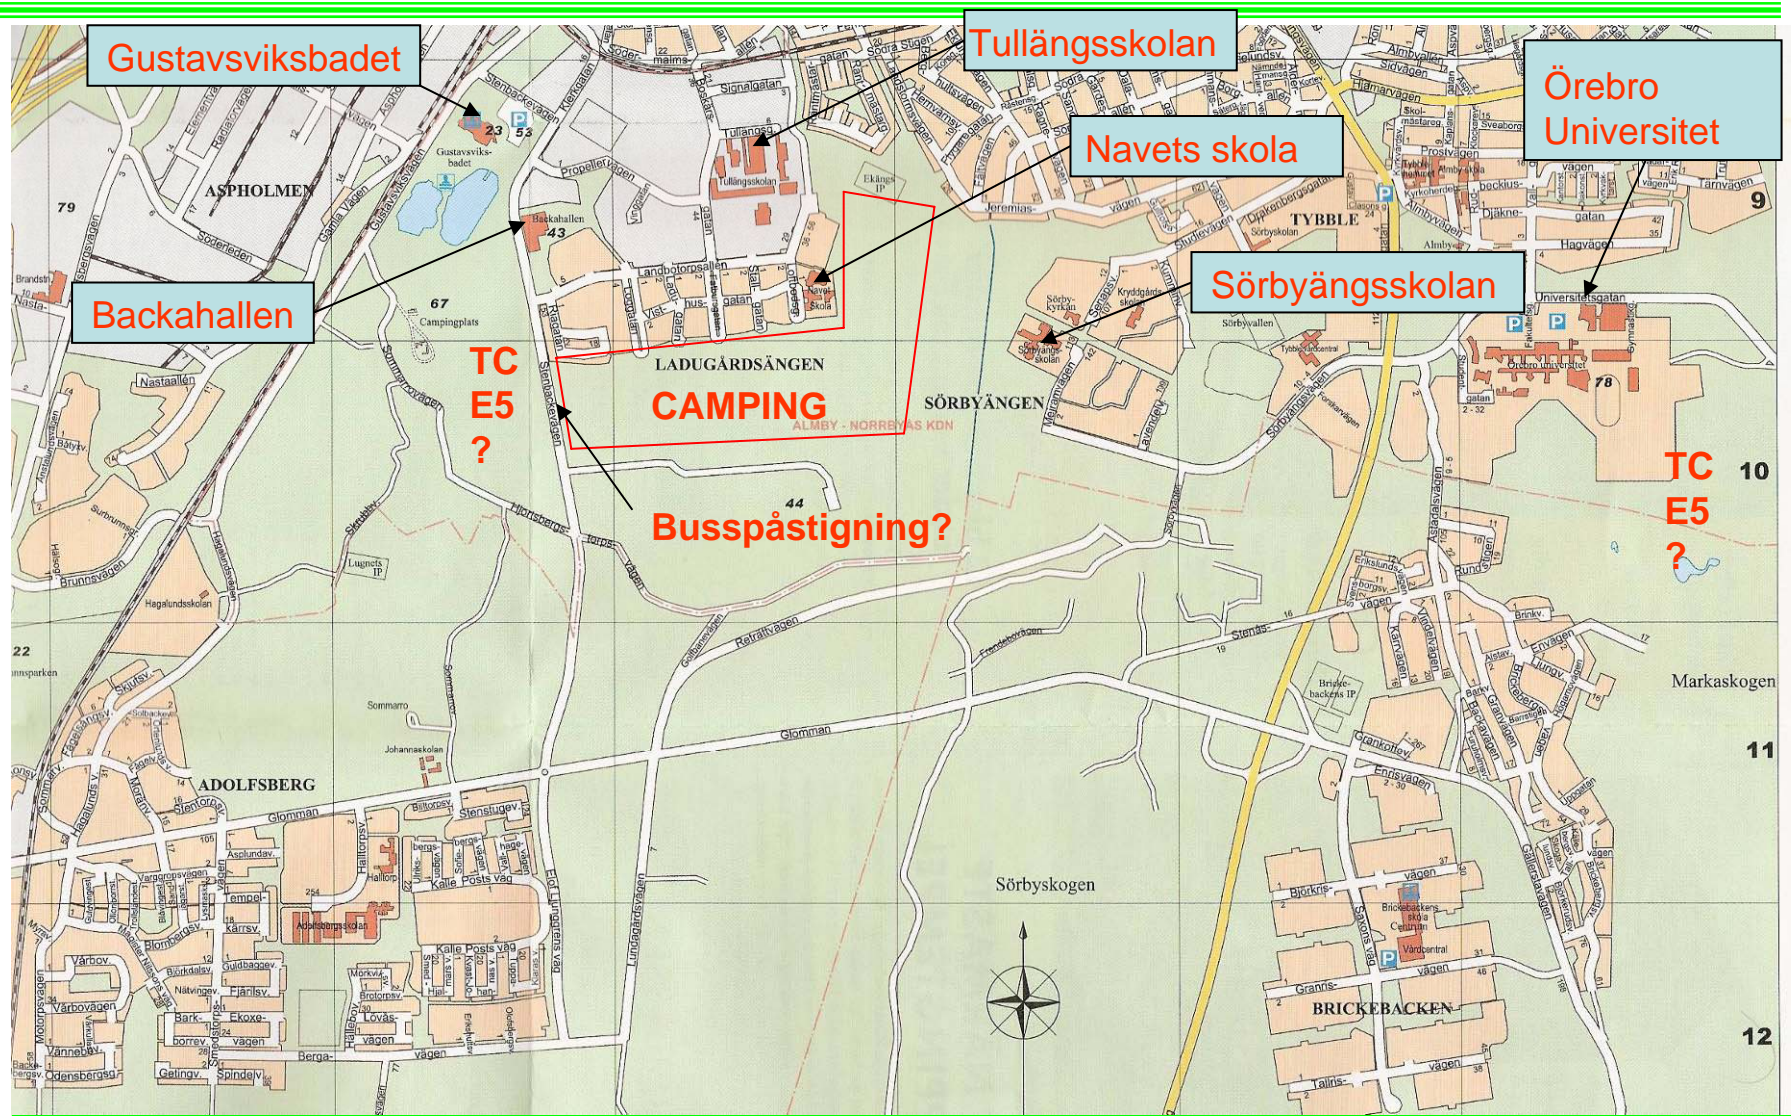

CENTRALORTEN



2010 ÖREBRO

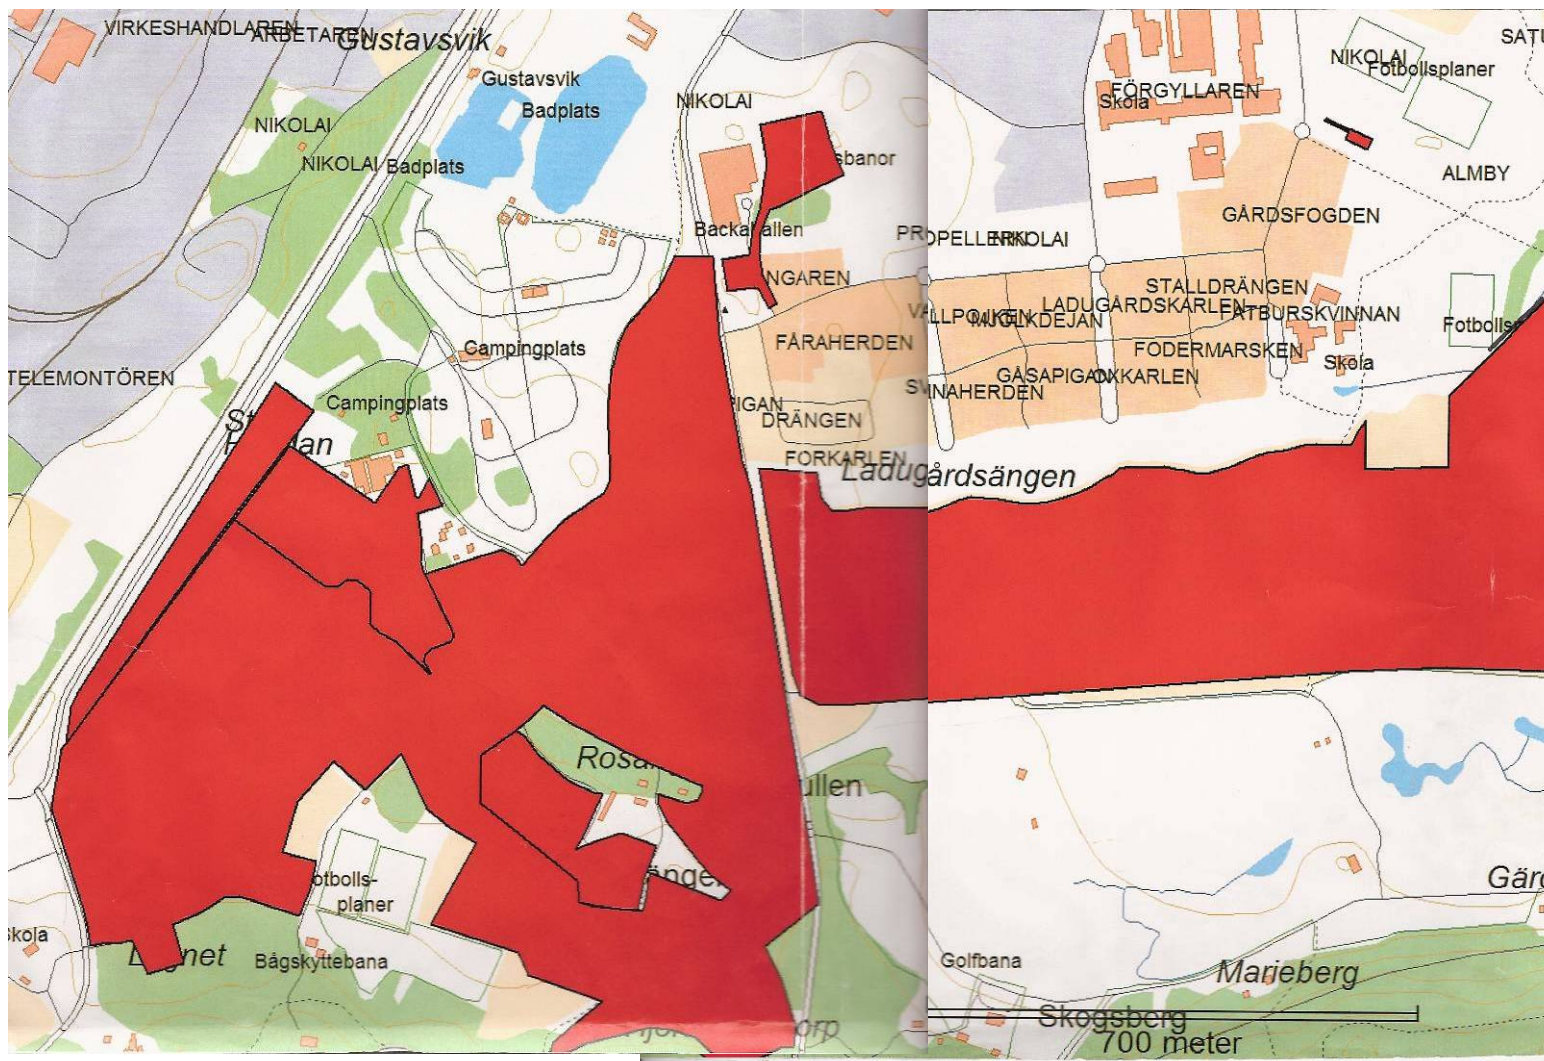

Örebro kommun's markinhav



C-ort/Kommunens planering

-
-
- **Centralortstorg.**
 - Försäljning/mässa. Ceremoniplats.
Presshögkvarter.
 - Övriga media.
 - **FLERA ALTERNATIV!**
 - Tullängsskolan
 - Gustavsvik/norr badet
 - Örebro Universitet
 - ?

CENTRALORTEN



2010 ÖREBRO



Gustavsvik - en resurs inom C-ort



Söder Gustavsvikbadet



Hotell inom C-ort
Närliggande hotell bokas tidigt.



Centralortssekretariat. Backahallen
Uthämtning av startpaket mm.
Information.Sambandscentral. Mässa

Camping Ladugårdsängen

- 3 500 platser. Yta per plats 7,5x8 m.
Reservområde 1000 platser.
(Söder om Gustavsvik)
- Boende på hårt underlag - Örebro
Universitet, skolor m fl platser.

Centralortsbyn. Ladugårdsängen



2010 ÖREBRO



Centralortsbyn. Ladugårdsängen



Tullängen - I centralt läge



Tullängsskolan - resurs inom C-ort



Tullängsskolan



Tullängsskolan - Gymnastiksal

-
-
- **Matinrättningar/restauranger.**
 - **Sportbutik.**
 - **Matvaruaffär.**
 - **Kiosker inom centralortsbyn.**
 - **Läggs ut på entreprenad?.**

Centralortsbyn - Ladugårdsängen



Tullängsskolan - Matsal



Navet - resurs på C-ort

-
-
- **Uppbyggnad av centralorten.**
 - Planeras att ske i samarbete mellan vår byggfunktion, Örebro kommun, Tullängsskolan, NEA, Atlas Copco m fl.
 - Entreprenörers byggbehov åtgärdas genom entreprenörens egen försorg.
 - Uppbyggnaden sker i samarbete mellan nämnda funktioner och innefattar - vägar, elanslutningar, teleanslutningar, vattenanslutningar, hygienplatser, renhållning, ceremoniplats, mässa, reklam, skyltning, uppmärkning av campingplatser.
 - Resurstöd (personal, materiel, maskiner mm) från Örebro kommun, Tullängsskolan m fl avtalas under år 2007.
 - Ladugårdsängen är planerad för utbyggnad av bostäder, vägar och gator. Vi prövar möjligheterna att samordna vårt behov av vägar och diverse anslutningar med kommunens gällande utbyggnadsplan och med kommunens stöd enligt ovan

Uppbyggnad av centralorten




2010 ÖREBRO

-
-
- Två etapper i norr, samma TC 2 dagar
 - Två etapper i söder, samma TC 2 dagar
 - Sista etappen i Örebro inom gångavstånd?


Etapperna




2010 ÖREBRO

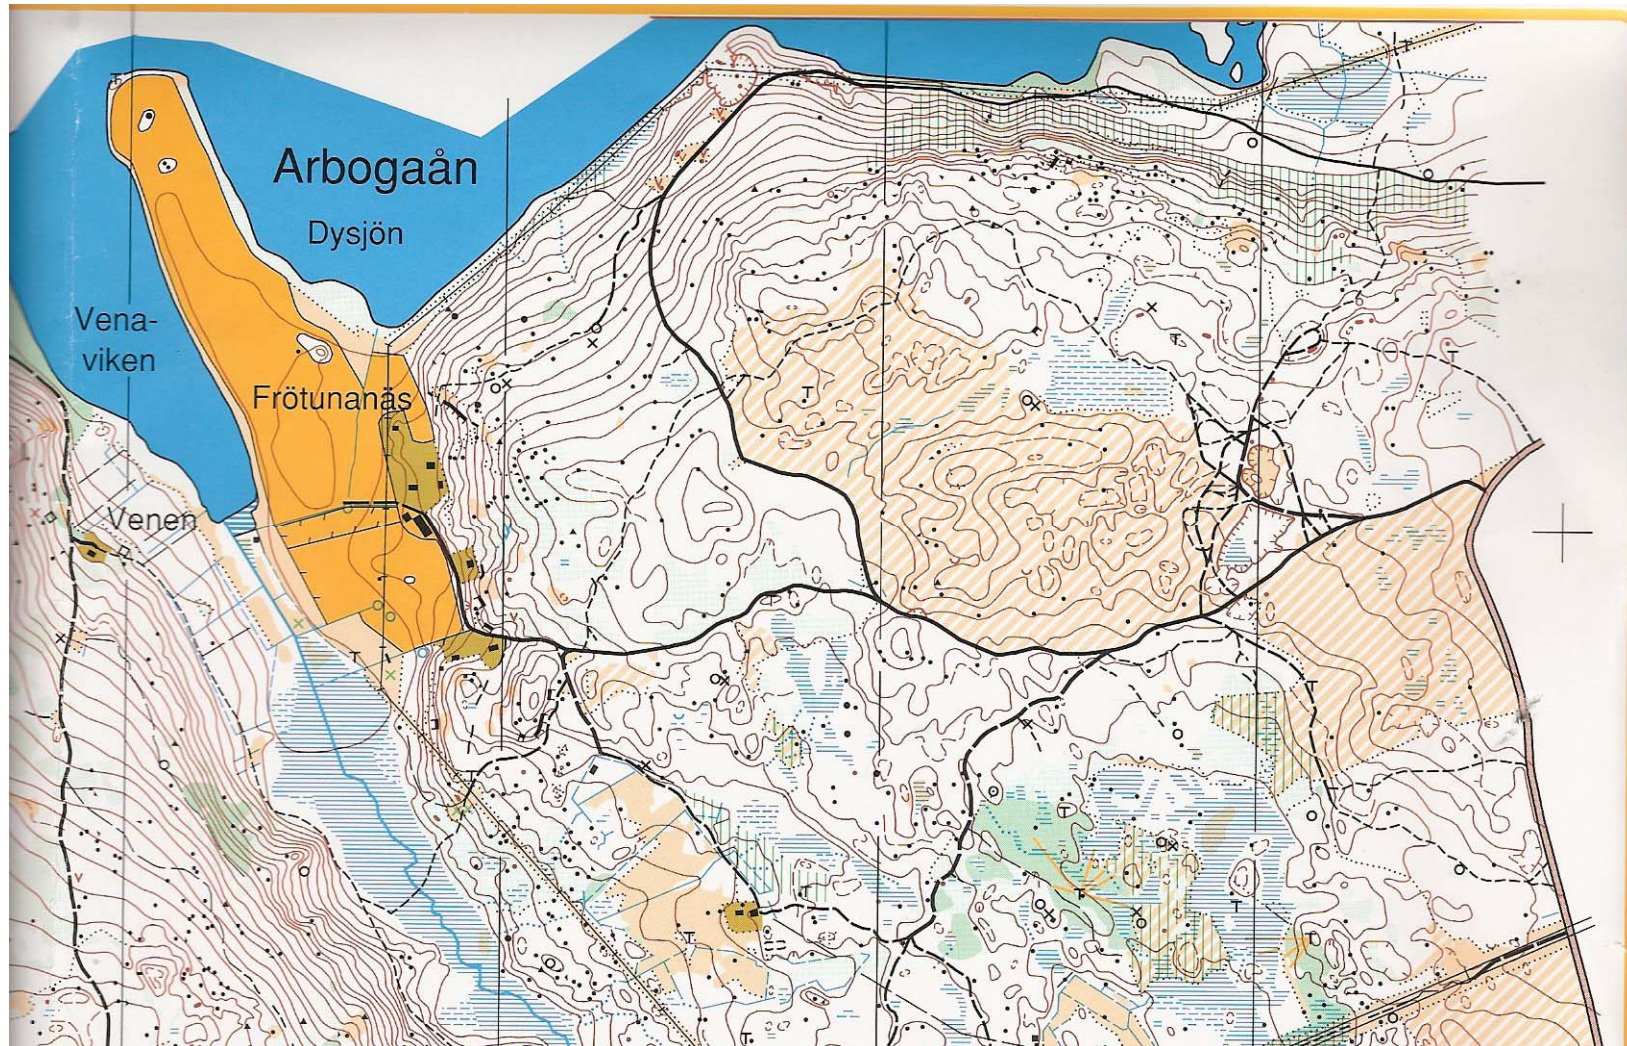

Norretapp Kägleborg - Norra delen

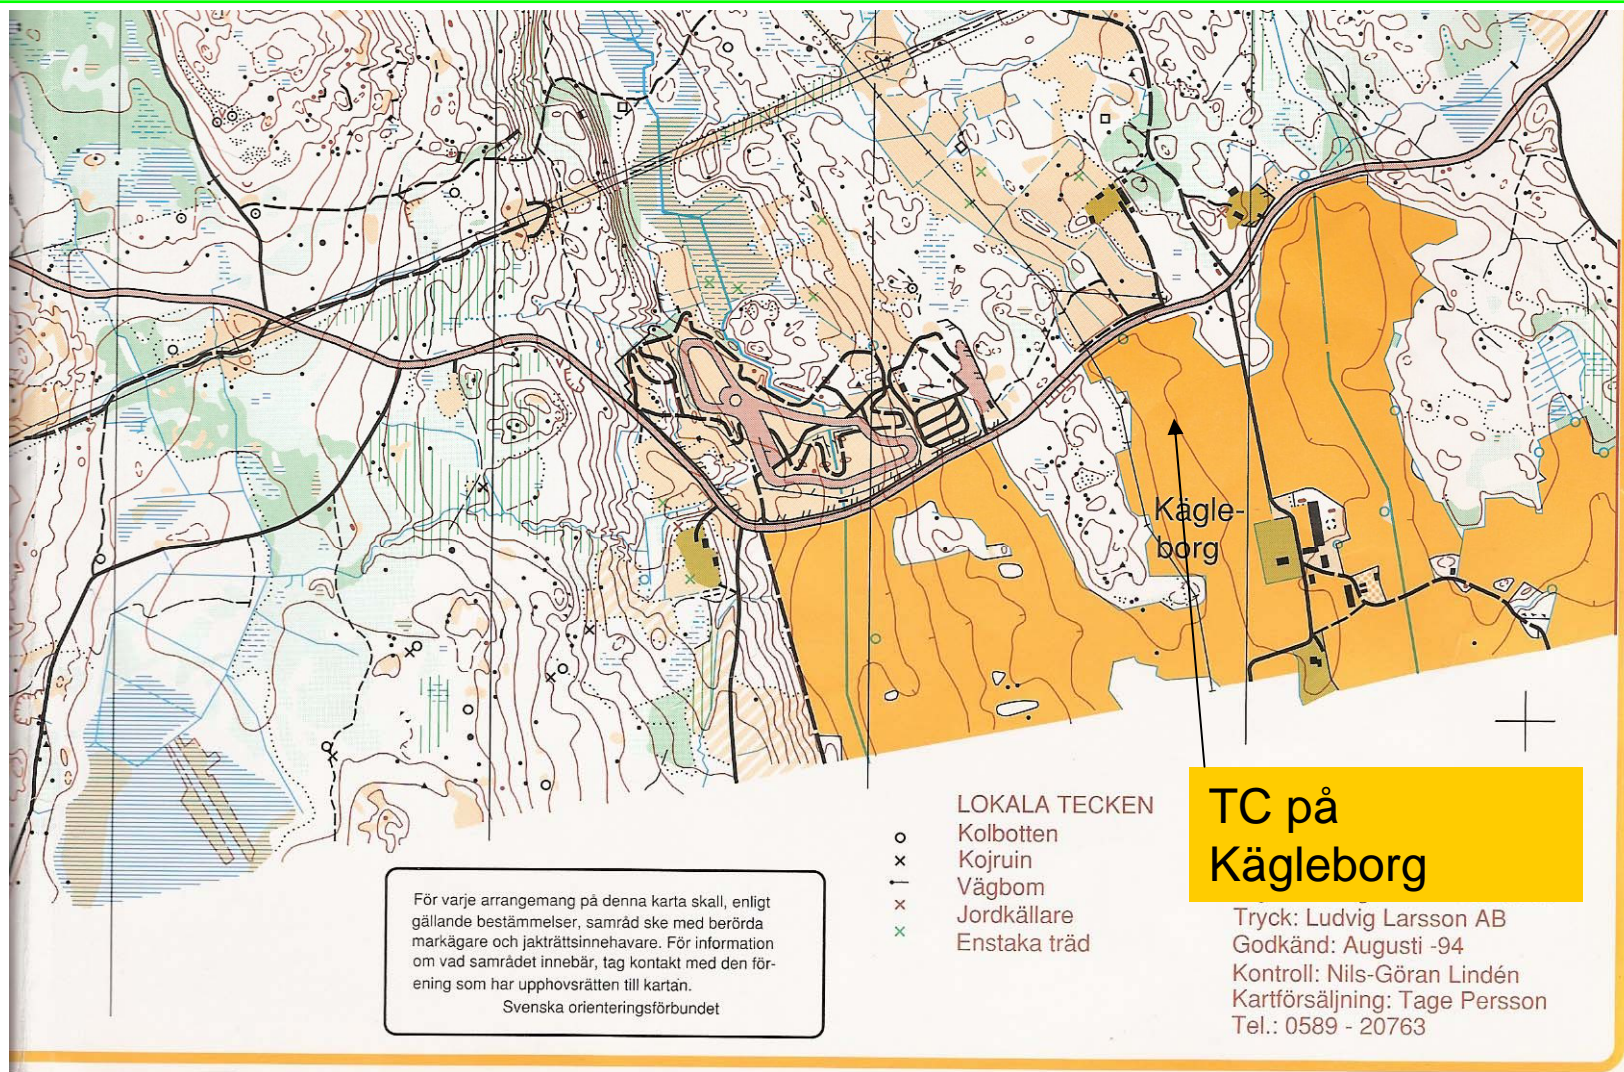


Norretapp Kägleborg - Södra delen

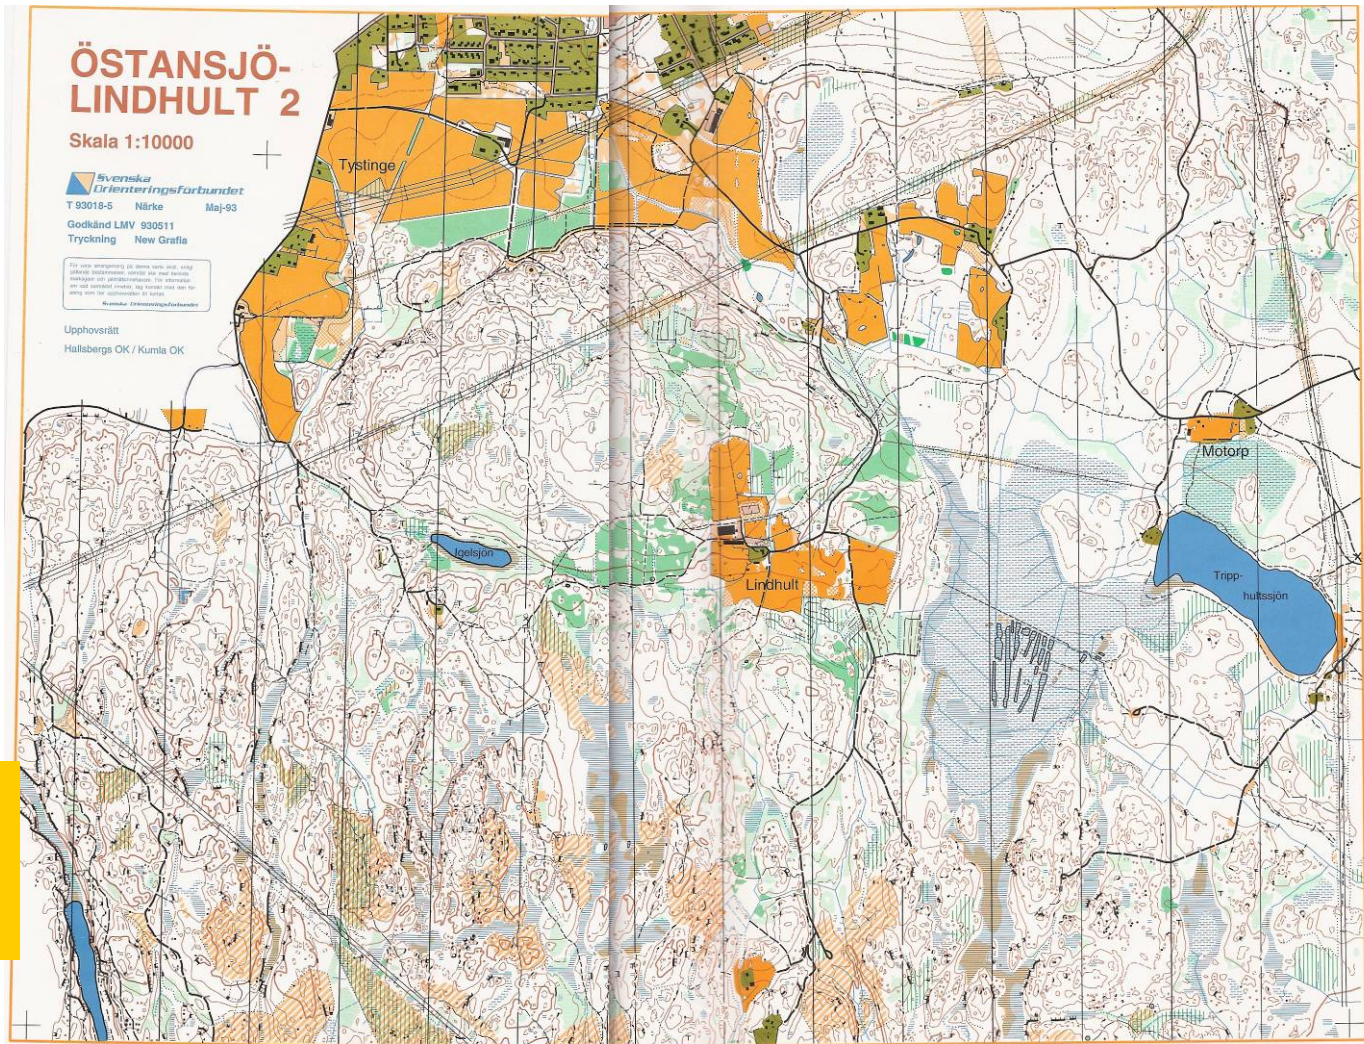


Dovra sjöar
med unik
spännande
terräng

Söderetapp
Östansjö

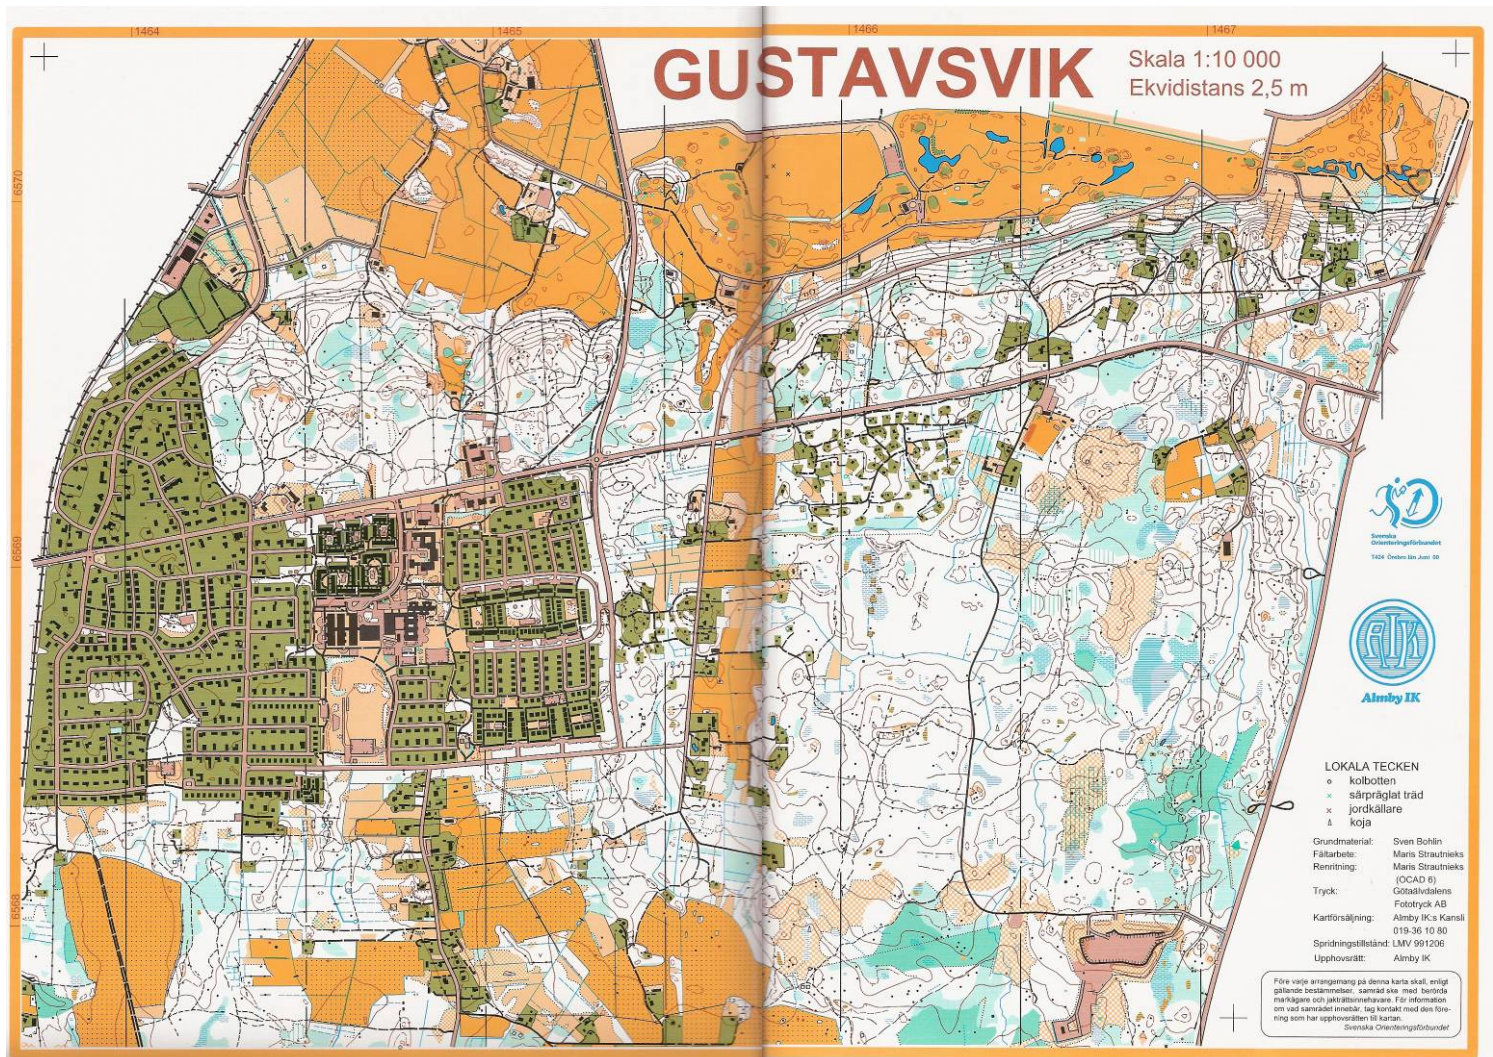


Sista etapp - Sörbyskogen ?
Närhet till C-ort

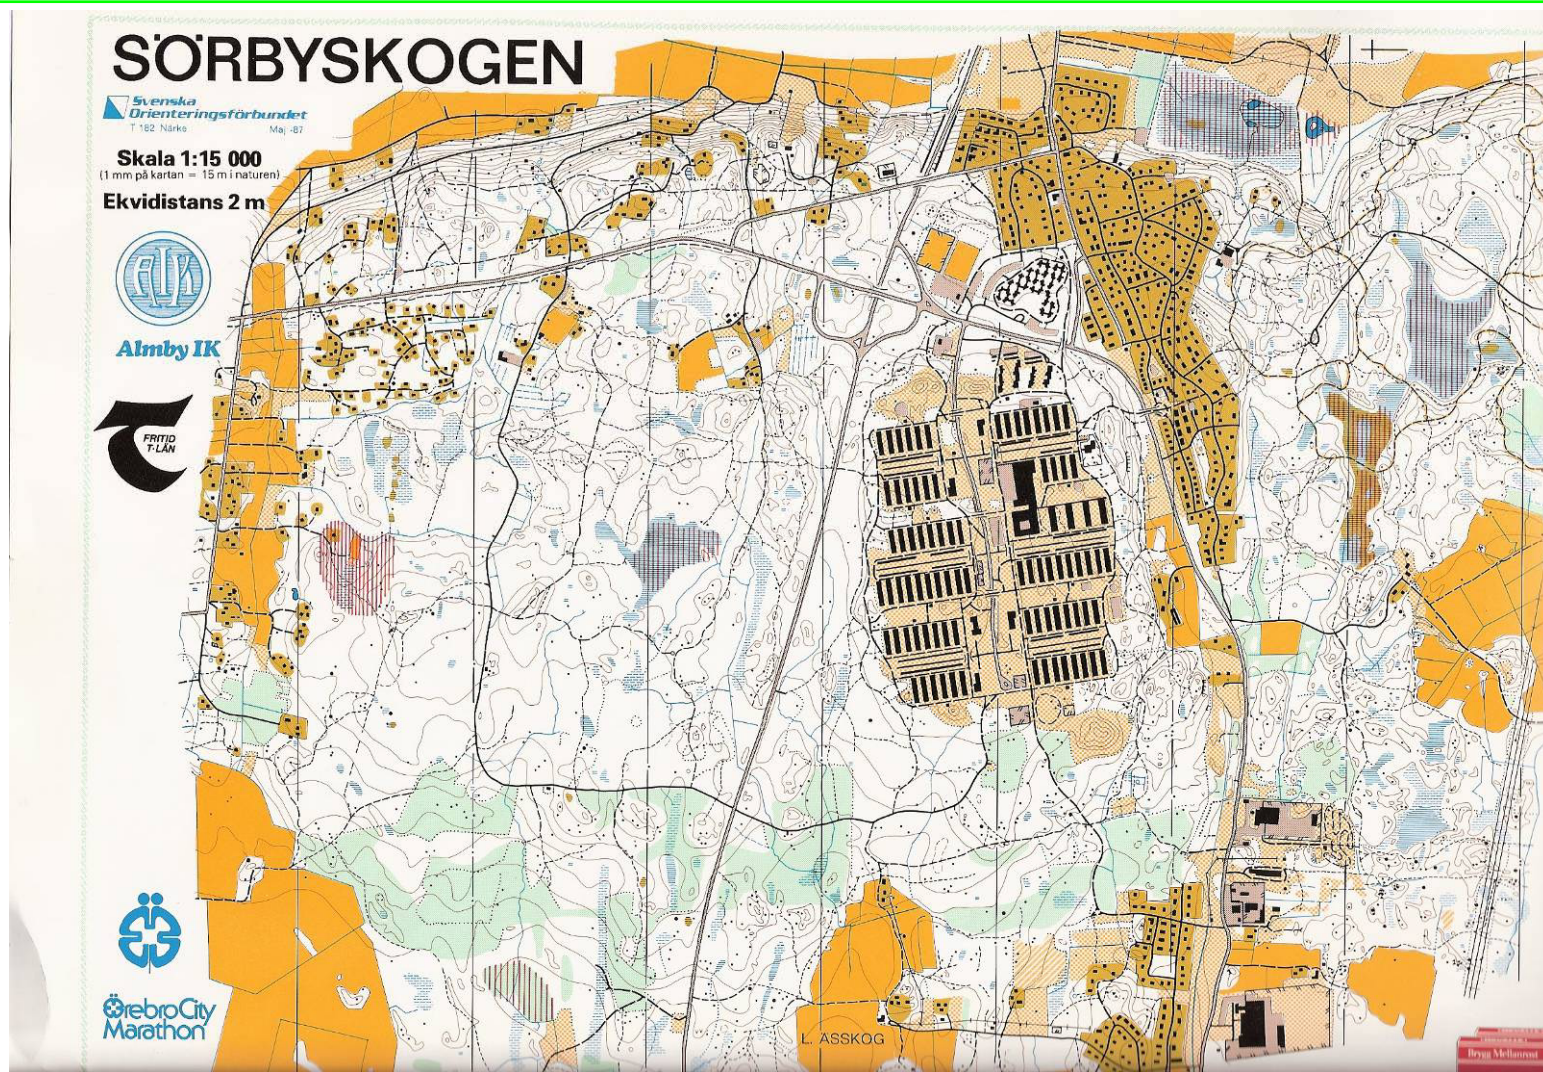

Sista etapp - Sörbyskogen ?
Närhet till C-ort

TC på
Örebro
Universitets
område

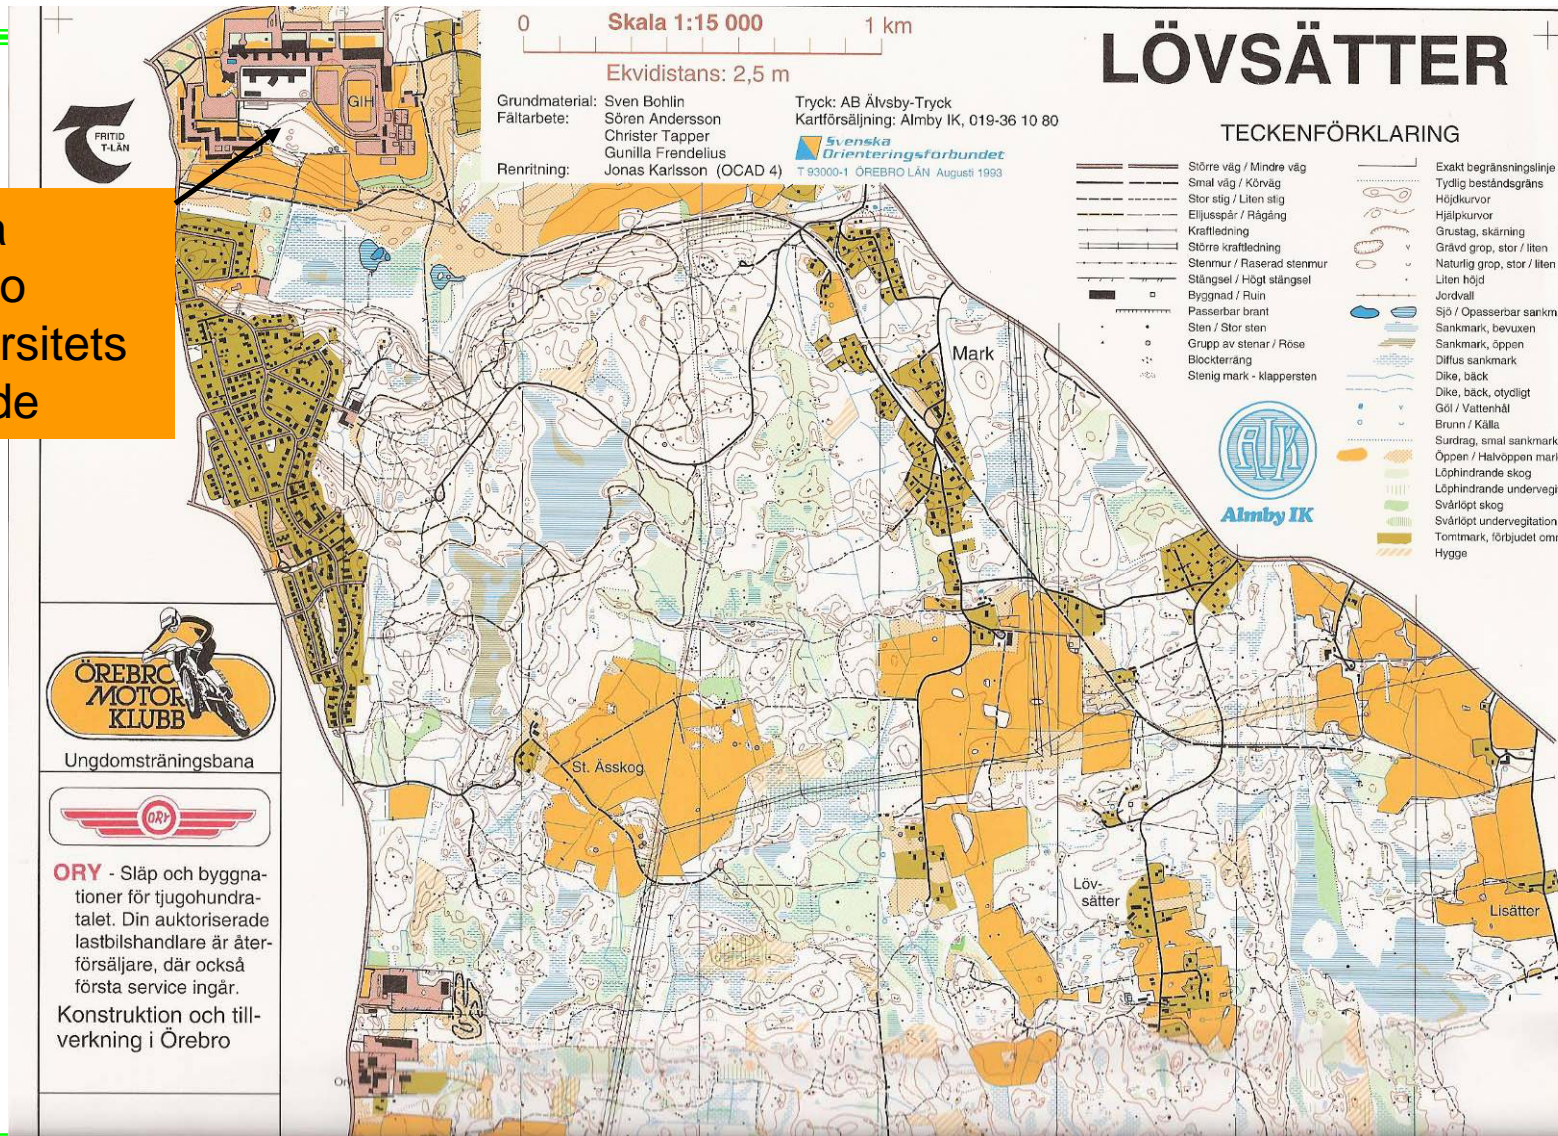

Sista etappen- Markaskogen?
Närhet till Örebro Universitet

-
-
- **LEDNINGSGRUPP**
 - **Hans Hacksell OK Milan.**
 - Generalsekreterare. Övergripande operativt ansvar.
Ingår i SOFT O-Ringengrupp
 - **Karin Sköldberg Garphyttans IF.**
 - Biträdande generalsekreterare.
Samordnar stödet från Örebro kommun för uppbyggnad av centralorten
 - **Ann-Mari Wåhlander Almby IK.**
 - Centralortschef
 - **Per-Anders Norman KFUM.**
 - Tävlingsadministrativ chef
 - **Mats Nylin OK Tisaren.**
 - Ekonomichef
 - **XXXX. Tävlingsledare**

LEDNINGSGRUPP



2010 ÖREBRO

-
-
- Ansvariga Blockchefer
 - Bemanning tvärs klubbgränser där det behövs.
 - Rätt kompetens på rätt plats höjer lägsta nivå i uppgiften

Organisation

-
-
- **Blockorganisation**
 - Block 1. Centralort
 - Block 2. Tävlingsadministration
 - Block 3. Tävling
 - Block 4. Logistik
 - Block 5. Trafik. Bussning
 - Block 6. Förläggning utanför centralortsbyn
 - Block 7. Priser. Ceremonier. Underhållning
 - Block 8. Information. Media. VIP
 - Block 9. Försäljning. Bl a avtal med huvudentreprenörer
 - Block 10. Marknadsföring. Lokala sponsorer
 - Block 11. Försvarsmaktsstöd. Sjukvård. Krisgruppsstöd. Säkerhetsfrågor. Samband
-
-

Blockorganisation




2010 ÖREBRO

-
-
- **KANSLI**
 - Upprättas årsskifte 2009/2010

Organisation

Exempel på samordning
för Block 1 - Centralort

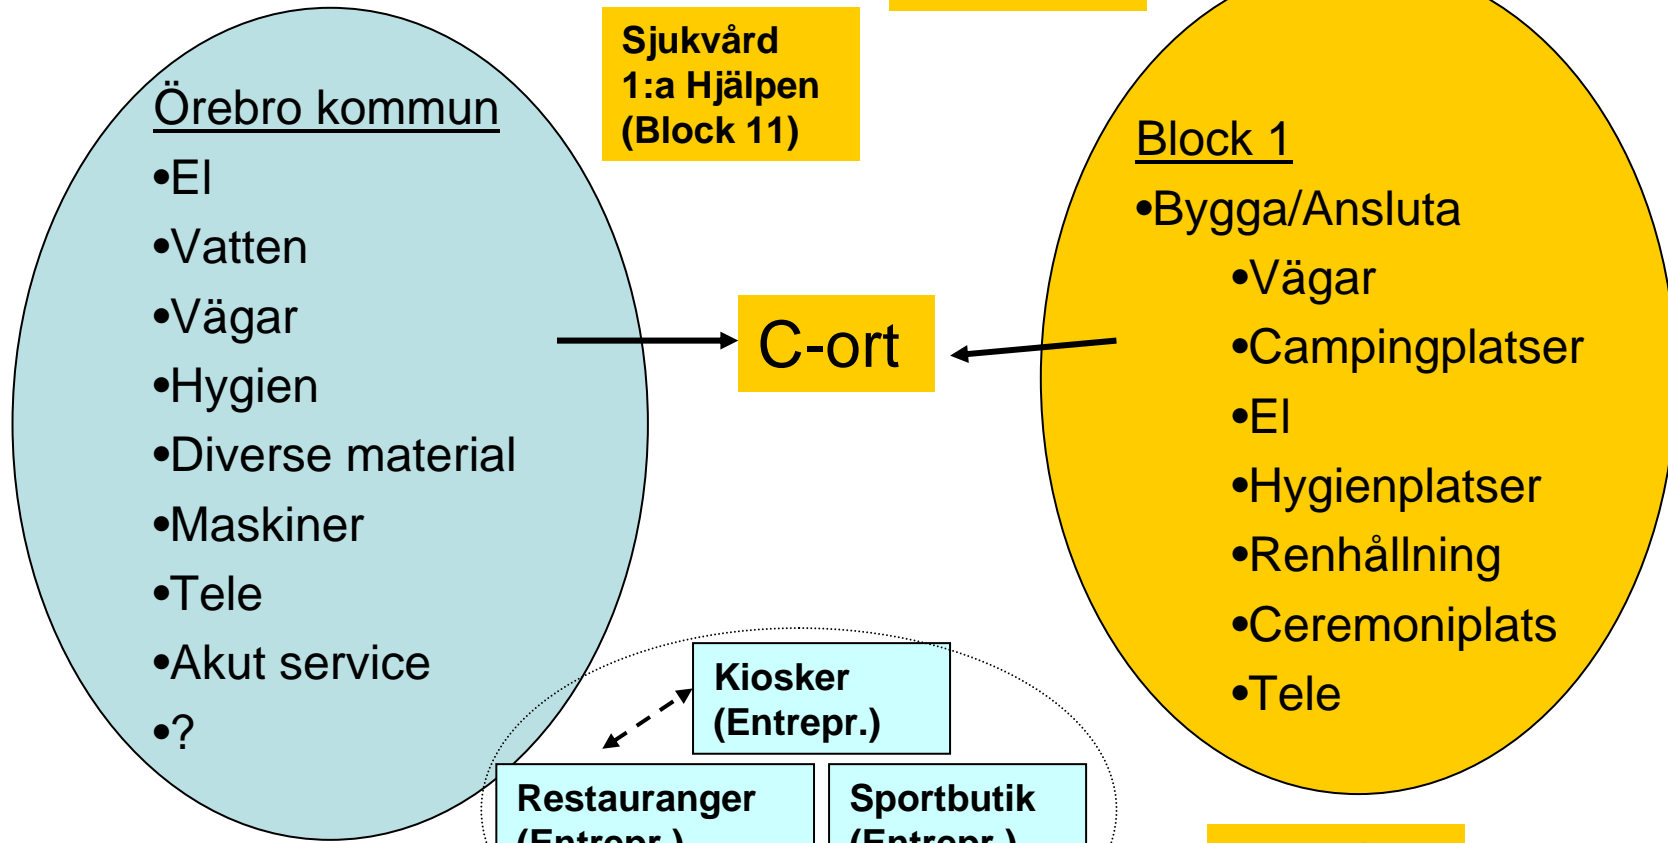

Organisation

-
-
- **PRIORITERADE ARBETSUPPGIFTER 2007**
 - Förutsatt att SOFT erhåller svaret "JA".
 - Fortsätta att rekrytera blockchefer.
 - Påbörja planeringen av PREO.
 - Budget.
 - Upprätta samarbetsavtal med SOFT.
 - Avtala stöd för uppbyggnad av centralorten.
 - Avtala markfrågor för centralorten. Markberedning.
 - Avtala markfrågor för etapperna.
 - Boka vissa konferensutrymmen och hotell.
 - Reglera försäljningsrättigheter.
 - Boka kansliutrymme.

PRIORITERADE ARBETSUPPGIFTER 2007



2010 ÖREBRO

- **ÖVRIGA ARBETSUPPGIFTER MED TIDIG PRIORITERING**

- Övergripande tids- och verksamhetsplan. Ledningsgruppen i samarbete med blockchefer.
- Preliminära blockplaner.
- Bemanning. Föreningen för större O-evenemang slutformulerar uppdraget till generalsekreteraren.
- Kvalitativa och kvantitativa mål.
- Resurser, handlingsregler, återredovisning.

- Operativa uppdrag till blockchefer.
- Regler för upphandling
- Beslut i stort.
- Marknadsföringen samordnas med SOFT m fl
- Huvuddelen av preliminära avtal rörande entreprenörer slutförs.
- O-Ringen och Bernadottska jubileet.
- Preliminär trafikplanering som underlag för avtal med bussbolag.
- Avtal med Örebro läns landsting.
- Avtal med Försvarsmakten

ÖVRIGA ARBETSUPPGIFTER MED TIDIG PRIORITERING



2010 ÖREBRO

-
-
- **YTTERLIGARE NÅGRA KOM-IHÅG**
 - Clinics?
 - Annonsförsäljning.
 - Utbildning för funktionärerna.
 - Ledarskapsfrågor.
 - Tvärsgrupper.
 - Pooler. Materiel, transporter, tält, hygien, el, skyltning.
 - Tidigt mediasamarbete.

YTTERLIGARE NÅGRA KOM-IHÅG



2010 ÖREBRO

Dagsverken 2000-2006

Hälsingland	12000
Småland	12084
Göteborg	15625
Bohuslän	18125
Skövde	15000
Uppland	15657
Närke	14540

Dagsverken fördelning Småland

Ledning	1785
centralort	1718
etapper	5208
adm	1949
övr	1424
	12084

Ekonomi

INTÄKTER (KKR)		KOSTNADER (KKR)	
Anmälningavgift	9961	Styrelse/Org.kom	-934
Logi	2803	Kansli	-2577
Buss/Park/cykelavgifter	1487	Tävling	-3037
Övriga avgifter	514	Adm	-673
spon/reklam	463	IT	-115
Mässan	196	C-ort	-1582
Försälj Etapp	84	Personal	-812
Försälj C-ort	103	Info/markför	-2394
Intäkt Restaurang	164	Marknad	-1353
Övriga intäkter	470	Service	-2348
Kartbidrag	820	Miljö	-24
bidrag mm	2133	Reseräkn föreningar	-330
SUMMA INTÄKTER	19199	Dagverksutbetalning	-2972
		Ekonomi	-46
		SUMMA KOSTNAD	-19199

Resultaträkning Småland

Ekonomiskt utfall		milj
2006	Hälsingland	4
2005	Småland	3
2004	Göteborg	2
2003	Bohuslän	1
2002	Skövde	2
2001	Uppland	0
2000	Närke	3

Ekonomi



Minnen från 2000



Minnen från 2000



Minnen från 2000
